ボーリング柱状図

調　査　名　平成１０年度立野ダム沢津野地区地質調査業務

事業・工事名

ボーリングNO.									
シートNO.									

ボーリング名		調査位置				北　緯	32 ° 53 ’ 9.363 ”
発注機関	国土交通省 九州地方整備局 立野ダム工事事務所			調査期間	～ 1999-03	東　経	131 ° 0 ’ 26.577 ”
調査業者名	株式会社東建ジオテック	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	562.05 m	角度	上 180° 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 000 °	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具
総掘進長	60.00 m								エンジン	ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) 測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0－10	10－20	20－30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
	561.75	0.30	0.30		黒ボク	黒																		
1					火山灰	濃褐																		
2																								
	559.05	2.70	3.00																					
3					黒ボク	黒																		
4	557.85	1.20	4.20																					
5					火山灰	濃褐																		
6																								
7																								
8	553.45	4.40	8.60																					
9					浮石（軽石）	橙褐																		
	552.25	1.20	9.80																					
10					火山灰	淡黄褐																		
	551.20	1.05	10.85																					
11	550.90	0.30	11.15		黒ボク	暗褐																		
					火山灰	濃褐																		
12	549.55	1.35	12.50																					
13					軟岩・風化岩	淡灰																		
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								

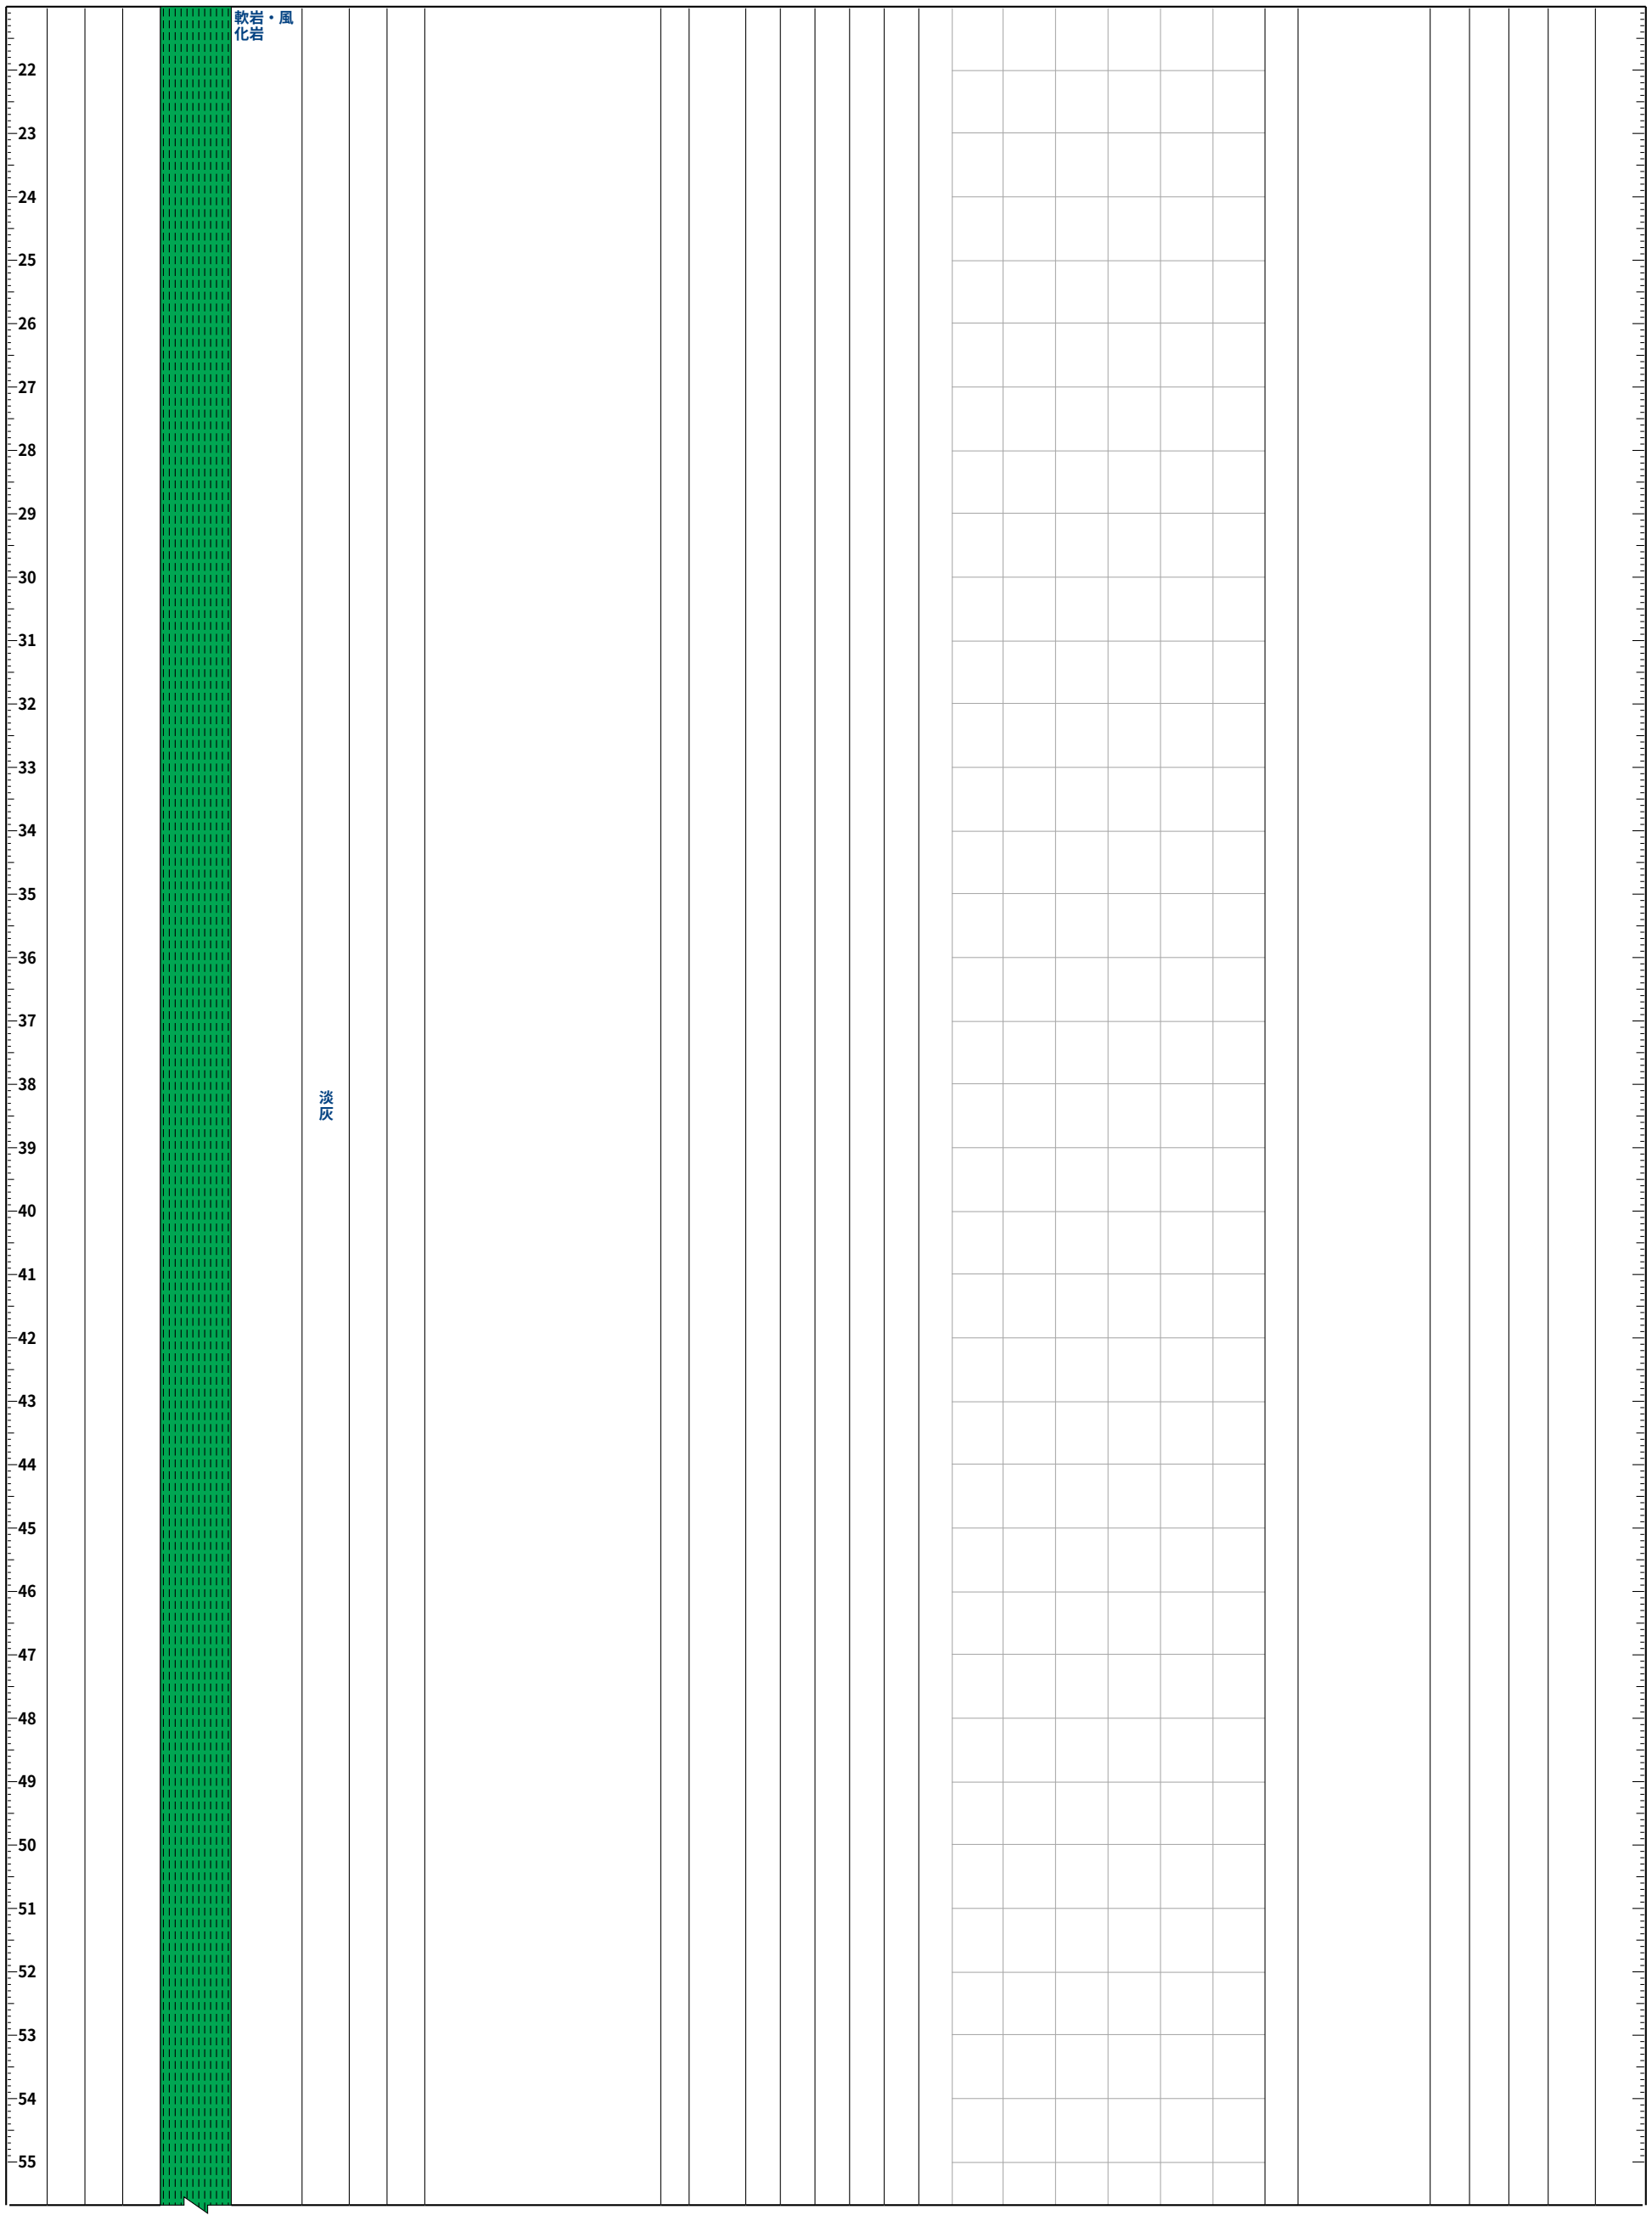
軟岩・風化岩
淡灰
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

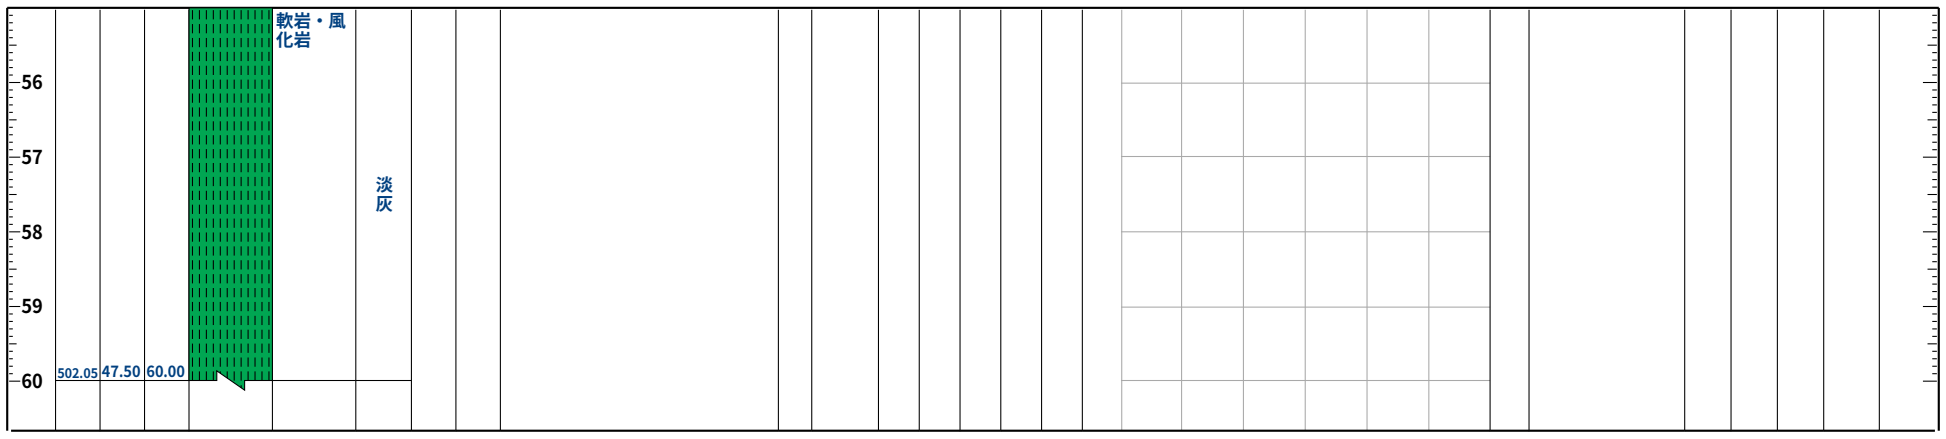
56
57
58
59
60
502.05
47.50
60.00
軟岩・風化岩
淡灰
